

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu  
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**


**PROTOKÓŁ Nr 661**

**z dnia 06-06-2017**

**z kontroli przewodów kominowych**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
„ŚW. FLORIAN” WE WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WALBRZYCH, Psie Pole 6  
Tel. (074) 94-23-286

**administrowanym przez MZB Sp.zo.o. BOK PODGÓRZE  
położonym w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości nr 79A**



**KONTROLA STWIERDZIŁA:**

1. Stan techniczny przewodów jest *dobry*, w dniu kontroli przewody *szczelne*
2. Podłączenia do przewodów są wykonane *nieprawidłowo*
3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*
4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych jest *prawidłowy*
5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 mieszkanie nr 12-wentylacja wywiewna w kuchni włączona do przewodu dymowego
6. Stwierdzone usterki i zaniedbania wykazane w protokole i załączniku należy usunąć *natychmiast*  
Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.

**Protokół otrzymują:**

1. Administrator – użytkownik budynku
2. Insp.Nadz.Budowlanego
3. a/a


**Mistrz Kominiarski**  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Daniel Siara

BOK „PODGOŹNIK”  
 WAŁBRZYCH  
 2017 -06- 0 0  
 L.dz. ....

NIEPODLEGŁOŚCI 79a


6-06-2017r.

Str.1/2

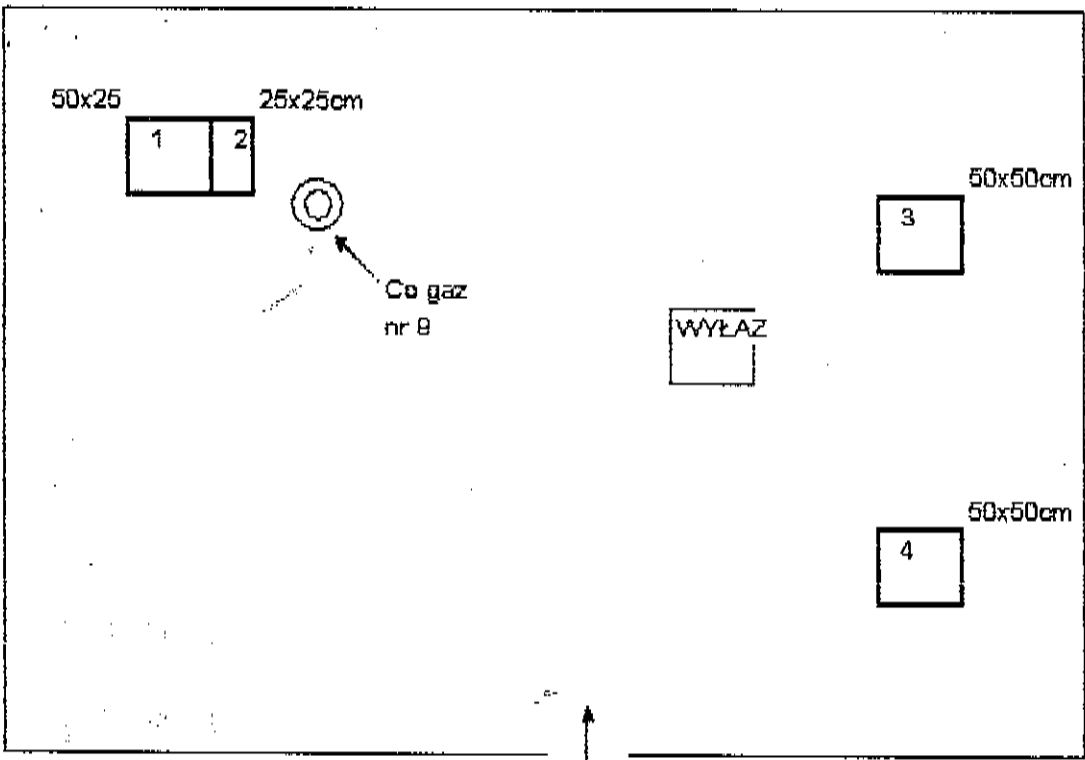

1	2	3	4	
Co 10+11	W 10	P 8A	P 12	Wk ← do natychmiastowego zamurowania
	Wk 9	P 7	P 6	II p strych
P 2		P 3	P 4	I p
				parter
				piwnica

Kominy w dniu kontroli, szczelne, drożne,



## NIEPODLEGŁOŚCI 79a

Str 2/2

Mieszk nr 1 trwa remont - nieobecni

Mieszk nr 2 brak wentylacji wywiewnej w kuchni w łazience , okna PCV brak nawiewników

Mieszk nr 3 brak wentylacji wywiewnej w kuchni

Mieszk nr 4 brak wentylacji wywiewnej w kuchni

Mieszk nr 6 brak wentylacji wywiewnej w kuchni i w łazience , okna PCV - brak nawiewników

Mieszk nr 7 brak wentylacji wywiewnej w kuchni , okna PCV brak nawiewników

Mieszk nr 8A brak wentylacji wywiewnej w kuchni

Mieszk nr 8 nie wpuściła

Mieszk nr 9 brak wentylacji wywiewnej w łazience, brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla kotła gazowego

Mieszk nr 10 + 11 bez uwag

Mieszk nr 12 okna PCV - brak nawiewników, wentylacja w kuchni włączona do komina dymowego .
